DREES & SOMMER

EMRIQ KELMIS

Städtebauliches Entwicklungskonzept mit Umsetzungsplan – Leistungskonzept

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft · Fachbereich Raumordnung, Wohnungswesen und Energie

Gesprächstermin · 14. Oktober 2026

AUSGANGSLAGE UND AUFGABE

Ein Innovationsquartier mit klarem Profil – verankert in Kelmis und der Euregio



Was die Deutschsprachige Gemeinschaft beabsichtigt

Ein Quartier, das Forschung, innovative Unternehmen, Produktion, Gründungen, Wohnen und Lebensqualität verbindet und die Brückenfunktion der DG zwischen Belgien, Nordrhein-Westfalen und den Hochschulen in Aachen, Lüttich und Maastricht stärkt.

Woran wir den Erfolg messen

- ✓ Schlüssige thematische Profilierung mit Alleinstellung in der Euregio
- ✓ Nachgewiesene Bedarfe und klar beschriebene Zielgruppen
- ✓ Robustes Struktur- und Nutzungskonzept mit Entwicklungsspielräumen
- ✓ Wirtschaftlich und organisatorisch tragfähiges Umsetzungsmodell
- ✓ Priorisierte Roadmap mit Kosten, Folgekosten und Zuständigkeiten
- ✓ Standortstory in Deutsch, Französisch und Englisch

DREES & SOMMER

UNSER ANSATZ

Strategie, Planung und Umsetzung in einem Prozess – aufbauend auf den vorhandenen Grundlagen

Grundlagen nutzen

Fachgutachten Raumordnung, Gewerbeflächenstrategie, OBL'EU und MORO werden zu Beginn zusammengeführt. Wir ergänzen gezielt, statt neu zu analysieren.

Fokussieren

Ein Thema statt Campusstrategie. Schwerpunkte werden transparent bewertet; die DG entscheidet auf nachvollziehbarer Grundlage.

Rechnen

Das Quartier wird aus Sicht von Eigentümer, Käufern und Investoren durchgerechnet: Exit-Szenarien, Grundstückswerte, Finanzierungsbedarf.

Umsetzen und vermitteln

Roadmap mit Zuständigkeiten und Meilensteinen sowie eine dreisprachige Standortstory für Investoren und Fachkräfte.

Interdisziplinäres Kernteam: Stadt- und Quartiersentwicklung · Immobilienökonomie · Projektmanagement · Nachhaltigkeit · Mobilität · Kommunikation

Projektleitung und Team mit Deutsch, Französisch und Englisch · persönlicher Ansprechpartner, bei Bedarf vor Ort in Eupen

DREES & SOMMER

LEISTUNGSUMFANG IM ÜBERBLICK

Acht Arbeitspakete in drei Phasen, begleitet von einem durchgängigen Abstimmungsprozess

Grundlagen und Analyse
Monate 1–4

AP 1 Projektstart, Grundlagen und Zielsystem — M1
- Arbeitsgrundlage, Zielsystem, Bewertungsrahmen

AP 2 Standort-, Markt- und Potenzialanalyse — M2
- Standortsteckbrief, SWOT, Entwicklungshebel

Profil und Konzept
Monate 4–10

AP 3 Themenprofil, Zielgruppen und Ecosystem — M3
- Themen- und Zielgruppenprofil, Betreibermodell

AP 4 Städtebauliches Entwicklungs- und Nutzungskonzept — M4
- Varianten, Vorzugsvariante, Phasierung

AP 5 Nachhaltigkeit, Mobilität und Resilienz
- Strategisches Konzept mit Indikatoren

Wirtschaftlichkeit und Umsetzung
Monate 9–16

AP 6 Wirtschaftlichkeit, Business Case und Finanzierung — M5
- Exit-Szenarien, Grundstückswerte, Slot-Sizes

AP 7 Umsetzungsstrategie und Roadmap — M6
- Top-10-Maßnahmen, Meilensteine, Risiken

Finalisierung und dreisprachige Übergabe — M7

AP 8 Kommunikation, Beteiligung und Vermarktung
Auftakt · vier Abstimmungen · zwei Workshops · Abschlusspräsentation · dreisprachige Standortstory und GIS-Karten

DREES & SOMMER

AP 1–3: GRUNDLAGEN, ANALYSE UND THEMENPROFIL

Vom gemeinsamen Zielsystem zur begründeten thematischen Ausrichtung

AP 1 **Projektstart, Grundlagen und Zielsystem**

- Auswertung vorhandener Gutachten, Strategien und Geodaten
- Zielsystem, Betrachtungsraum und Kriterienrahmen

Ergebnis: Abgestimmte Arbeitsgrundlage und Bearbeitungsplan

AP 2 **Standort-, Markt- und Potenzialanalyse**


- Standort, Mobilität und Wohnungsmarkt
- Vergleichsstandorte, Nachfrage, Effekte des Einstein-Teleskops

Ergebnis: Standortsteckbrief mit SWOT und Entwicklungshebeln

AP 3 **Themenprofil, Zielgruppen und Ecosystem**

- Bewertung der Schwerpunkte, Empfehlung mit Alternativen
- Zielgruppen, Anforderungen, Partner- und Betreibermodell

Ergebnis: Begründetes Themen- und Zielgruppenprofil

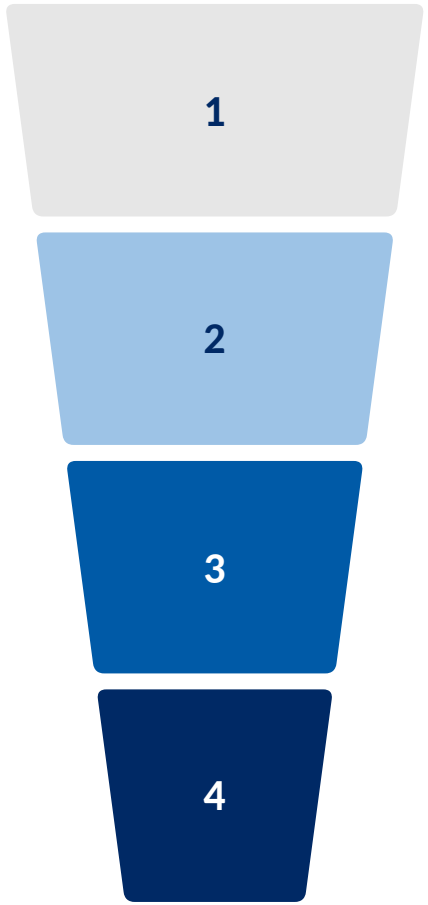

Breite Prüfung: elf Branchencluster
aus Vorarbeiten, OBL'EU und Gewerbeflächenstrategie

Bewertung nach einheitlichen Kriterien
Marktpotenzial, regionale Kompetenzen, Förderkulisse, Ansiedlungschancen, Anschluss an Aachen, Lüttich und Maastricht

Auswahl mit geprüften Alternativen
zwei bis drei Profile, nachvollziehbar begründet

Empfehlung und Entscheidung der DG
im Workshop 1 (Themenprofil und Entwicklungskonzept)

DREES & SOMMER

AP 4–5: ENTWICKLUNGSKONZEPT, NACHHALTIGKEIT UND MOBILITÄT

Varianten, Vorzugsvariante und Phasierung – verknüpft mit Ortskern und Bahnhof Hergenrath

Abbildung folgt

AP 4 **Städtebauliches Entwicklungs- und Nutzungskonzept**

- Räumlich-funktionales Leitbild und Flächenprogramm
- Städtebau, Freiraum, Erschließung, Infrastruktur
- Variantenvergleich und Vorzugsvariante
- Phasierung, Flexibilität, erste Aktivierungsmaßnahmen

AP 5 **Nachhaltigkeit, Mobilität und Resilienz**


- Ziele für Energie, Klima, Ressourcen, Biodiversität und soziale Qualität
- Multimodale Erreichbarkeit mit weniger Autoverkehr
- Klimaangepasste Freiräume, Regenwasser, zirkuläres Bauen
- Messbare Indikatoren für Planung und Umsetzung

DREES & SOMMER


AP 6: WIRTSCHAFTLICHKEIT, BUSINESS CASE UND FINANZIERUNG

Das Quartier aus Sicht von Eigentümer, Käufern und Investoren rechnen

Basisstrategie und Exit-Zeitpunkte

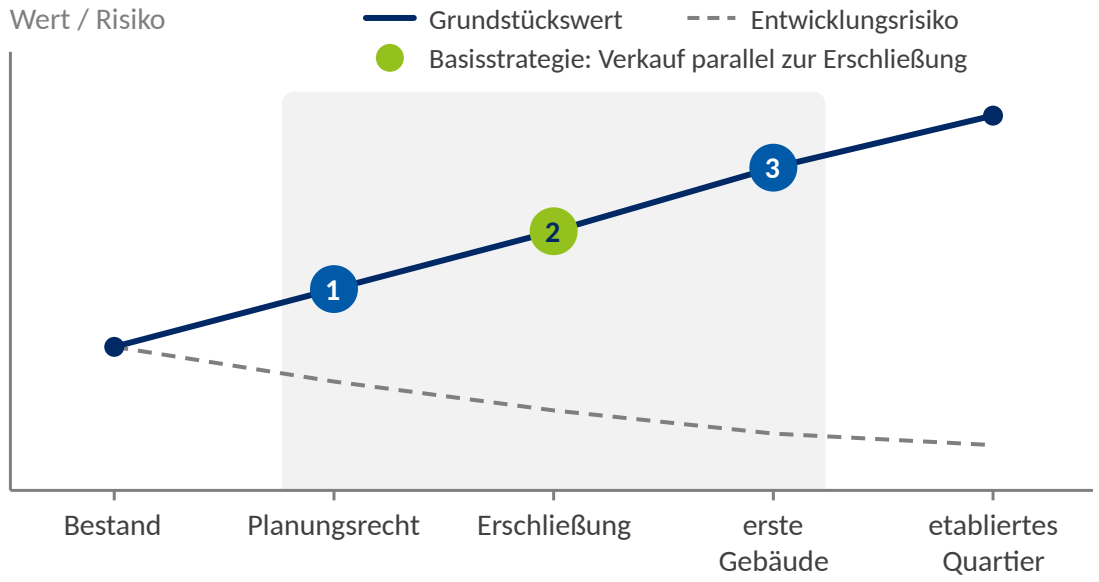

Grundstückswert nach Residualwertmethode

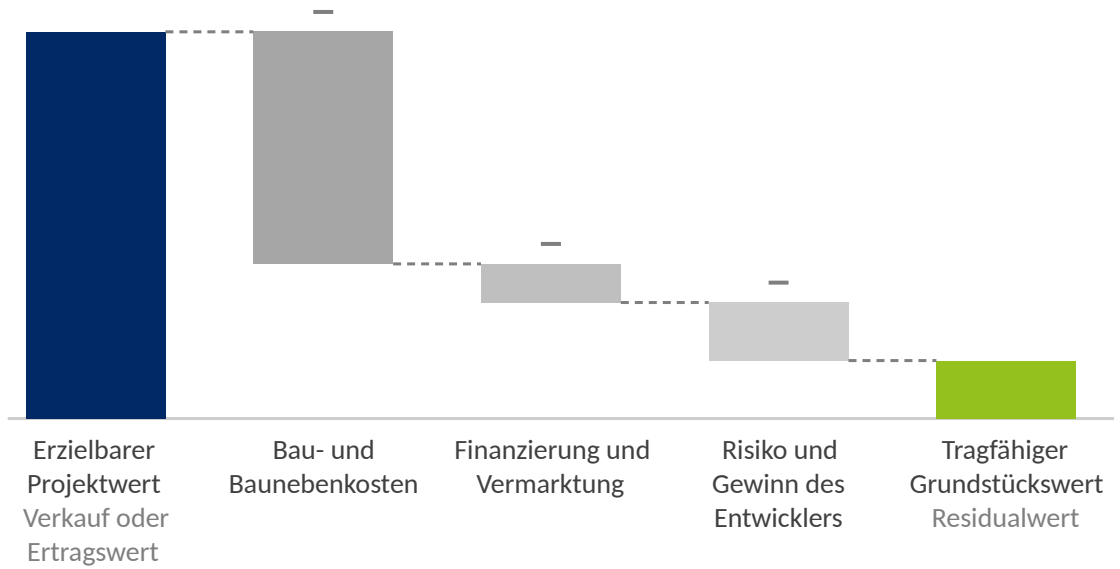

Exit-Szenarien

Verkauf nach Planungsrecht, parallel zur Erschließung oder nach Vermarktungsstart

Slot-Sizes

Grundstücks- und Investitionsgrößen, die finanzierbar und kapitalmarktfähig sind

Parzellierung

Eigenständig erschließbare, entwickelbare und vermarktbare Grundstücke

Öffentliche Hand

Kosten, Erlöse und Finanzierungsbedarf, Folgekosten und Einnahmen

DREES & SOMMER

AP 7–8: UMSETZUNG, KOMMUNIKATION UND VERMARKTUNG

Priorisierte Roadmap und schlanke, verbindliche Abstimmungsformate

AP 7 Umsetzungsstrategie und Roadmap

- Top-10-Maßnahmenkatalog mit Prioritäten, Abhängigkeiten und Entscheidungsbedarfen
- Termin- und Meilensteinplanung mit Abschluss deutlich vor dem 31.10.2028
- Zuständigkeiten, Ressourcen und Schnittstellen
- Genehmigungs-, Planungs- und Vergabefahrplan auf Verfahrensebene
- Risikoanalyse mit Gegenmaßnahmen

AP 8 Kommunikation, Beteiligung und Vermarktung

1 **Auftakt**
digital, bis 90 Minuten

4 **Abstimmungen**
digital, je bis 45 Minuten

2 **Workshops**
je bis 3 Stunden, einer in Präsenz


1 **Abschluss**
Präsentation, digital, bis 90 Minuten

- Standortstory und Vermarktungsbausteine in Deutsch, Französisch und Englisch
- GIS-fähige Karten im belgischen Lambert-System, kurzfristige Aktivierungsmaßnahmen

DREES & SOMMER

ZEITPLAN UND MEILENSTEINE

Abschluss nach rund 16 Monaten – deutlich vor dem Endtermin am 31. Oktober 2028

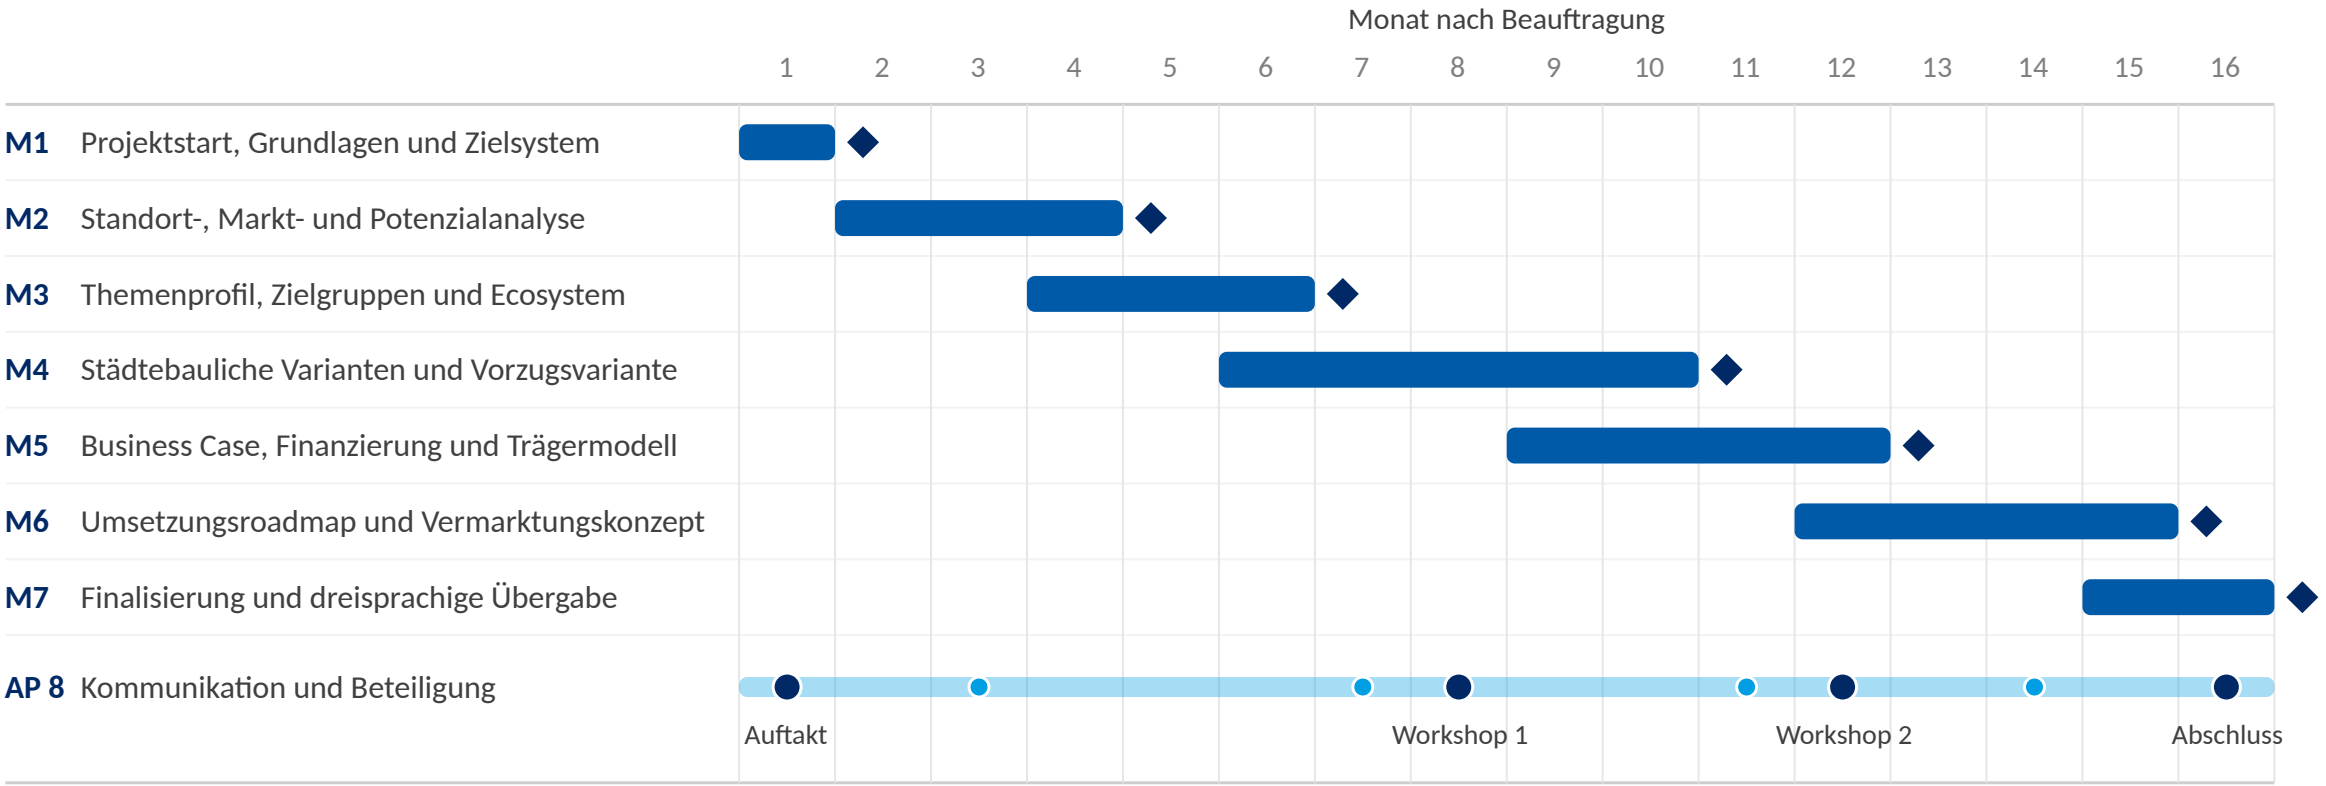

Lage der Termine indikativ, Festlegung im Kick-off · Endtermin laut Lastenheft: 31.10.2028

DREES & SOMMER

LIEFERGEGENSTÄNDE UND NÄCHSTE SCHRITTE

Was die Deutschsprachige Gemeinschaft erhält und wie wir starten

Liefergegenstände

- Projekt- und Bearbeitungsplan mit Termin-, Risiko- und Entscheidungslogik
- Standort-, Markt- und Potenzialanalyse mit Standortsteckbrief
- Themen-, Zielgruppen- und Ecosystem-Konzept
- Entwicklungs- und Nutzungskonzept mit Vorzugsvariante
- Nachhaltigkeits-, Mobilitäts- und Infrastrukturkonzept
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit offengelegten Annahmen
- Finanzierungs-, Förder-, Träger- und Betreibermodell
- Umsetzungsplan mit Maßnahmen, Prioritäten und Zuständigkeiten
- Vermarktungsunterlagen in Deutsch, Französisch und Englisch
- GIS-Karten, Protokolle, Abschlussbericht mit bearbeitbaren Dateien

Qualitätssicherung

Vier-Augen-Prinzip, fachübergreifende Reviews an den Meilensteinen, dokumentierte Freigaben, fachliche Prüfung der französischen und englischen Fassung

Nächste Schritte

1. Offene Punkte aus dem heutigen Termin klären: Betrachtungsraum, Themenpräferenz, Formate der Ergebnisse
2. Angebot auf dieser Grundlage abschließen
3. Beauftragung und Auftakt im ersten Monat
4. Bereitstellung der Grundlagen: Fachgutachten, Gewerbeflächenstrategie, MORO-Bericht, Geodaten

DREES & SOMMER
